





Måleparameter

I henhold til plan

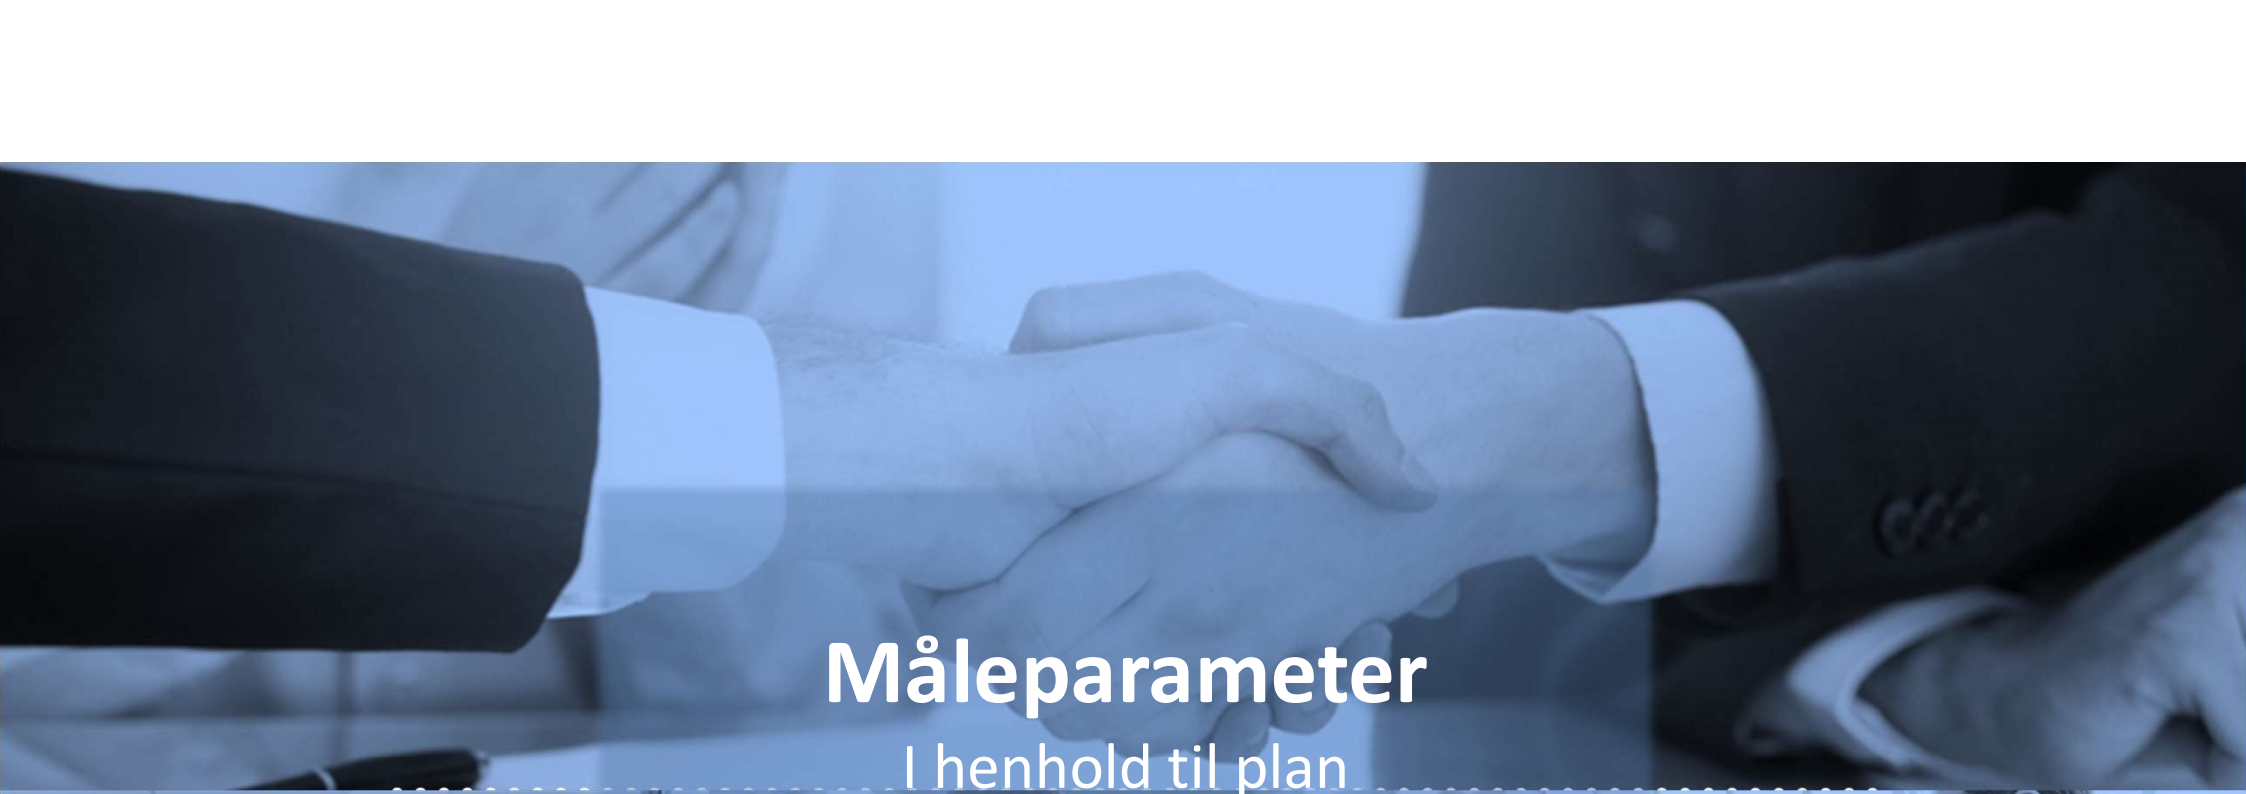

Arbeid med å gjøre rapportering på plan mer helhetlig og standardisert

Endre fokus til å dekke hele porteføljen – samt øke fokus på leveransetidspunkt

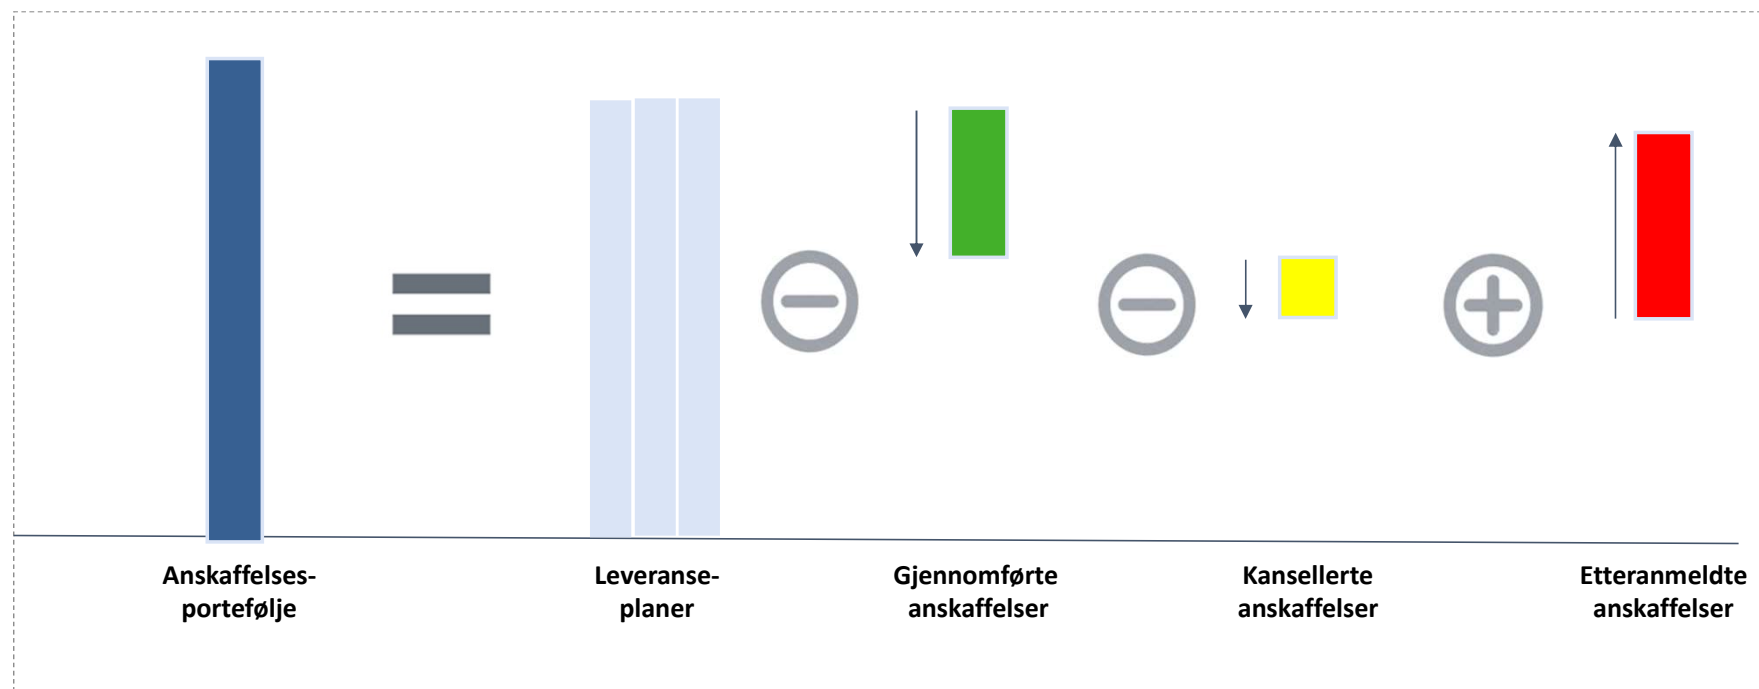

Der leveranseplanen inkluderer alle aktive og nye innmeldte anskaffelser ved inngangen av et nytt år, uavhengig av tidspunktet anskaffelsen er meldt inn



SYKEHUSINNKJØP

Hvilke endringer i målingen «iht. plan» er det som forslås?



Dette er likt

Benytter samme definisjon på populasjonen som skal måles
(antall ikke startet + antall pågående – kansellerte – gjennomførte)


Det er milepælsdato og dagens dato som er utgangspunkt for målingen

Dette er foreslåtte endringer

1. Det etableres en leveranseplan hvert år som et fastpunkt – med fokus på leveransedato
2. Etteranmeldte anskaffelse defineres automatisk – alle innmeldinger etter at leveranseplan er låst
3. Målingen starter på nytt hvert år – ny leveranseplan legges til grunn for kommende års måling
4. Måles mot færre milepæler – fokus på målinger mot de viktigste milepælene
5. Åpner for at re-planlegging ikke automatisk fører til negativt avvik – har endelig leveranse i fokus

Leveranseplan som fastpunkt, og definisjon av etteranmeldt

Målingen nulles ut hvert år

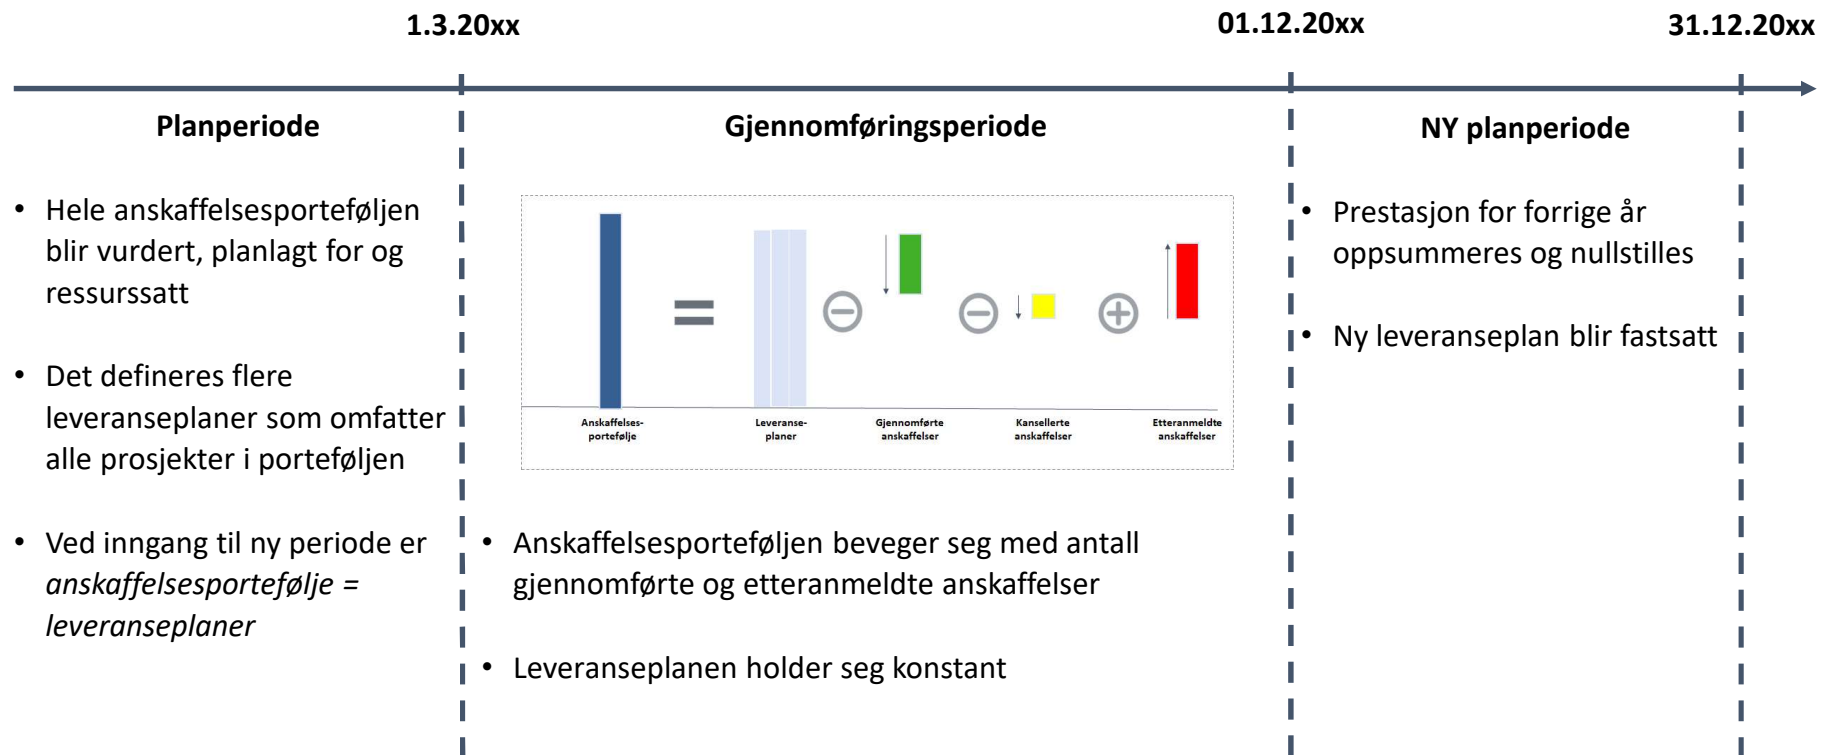



En beskrivelse av endringen

Måles mot utvalgte milepæler og fokus på leveransedato

Milepælene som måles på

Gjør det enklere å kommunisere til prosjektleder, samt til de det skal rapporteres mot – uten at det går utover kvaliteten på rapporteringen

Datofelt
Prosjektoppstart
Kunngjøring
Avtale tildelt
Prosjekt ferdig
Virkningsdato

Endring av plan uten effekt på leveranse vil være mulig

En prosjektleder vil ha mulighet til å revidere milepæler før endelig leveranse, uten at de automatisk blir målt som «ikke iht. plan» - mer presis måling på faktisk forsinkelse.

Prosjektleder har mulighet til å endre uten at det automatisk får påvirkning på måling, så lenge «prosjekt ferdig» eller «virkningsdato» ikke forsinkes. Dagens dato sees opp mot datofelt i kildesystem i følgende rekkefølge: Revidert – Estimert. Hvis dagens dato passerer gjeldende dato vil prosjektet klassifiseres som ikke i henhold til plan.

Alle forsinkelser regnes som avvik til plan – det vil alltid sees til dato i estimated feltet (opprinnelig plan). Vil først kunne endres i ny planprosess.

I henhold til plan (hvordan skal det løses i praksis)

Formel


For en gitt populasjon:

*Antall anskaffelser der dagens dato ikke overstiger
revidert eller planlagt dato for gjeldende milepæl
og som ikke har flyttet leveransedato**

Total antall anskaffelser i populasjonen

*Leveransedato = «Prosjekt ferdig» eller «virkningsdato»

Populasjon

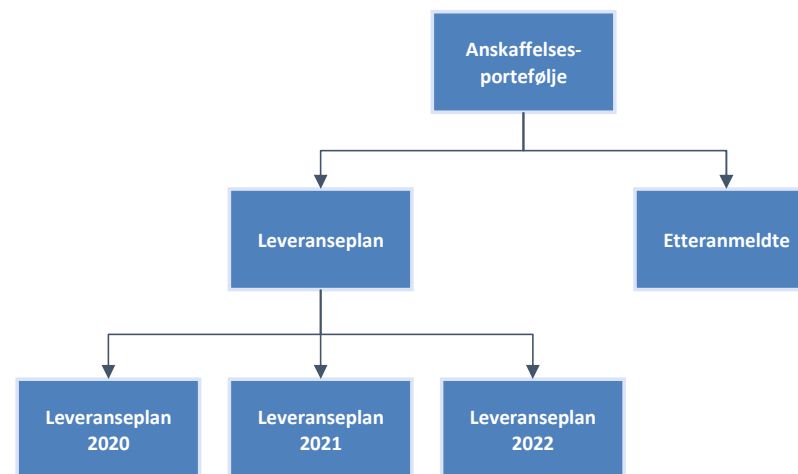

SYKEHUSINNKJØP
